

## **"PLANIFICACIÓN SEMANA DEL 09-10-2017 AL 13-10-2017"**

A continuación se indica el PRIMER PLANNING semanal de trabajos a desarrollar por parte de la mercantil CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L. para la ejecución de las obras del Proyecto de "MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ÁREA INDUSTRIAL CASA PAU, L'ALFÀS I y L'ALFÀS II" promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Ibi.

Los trabajos a desarrollar durante la Semana del 09/10/2017 al 13/10/2017 serán los siguientes:

### **1.- UD. FORMACIÓN DE PASO PEATONAL ACCESIBLE, INCLUSO CARRIL BICI.**

La unidad consiste en la Pavimentación y conformación de las pendientes para pasos peatonales accesibles en acerados del polígono y cruces afectados por coincidir con el trazado del itinerario del carril bici proyectado.

Las actuaciones se circunscriben a la totalidad de los pasos a conformar, distribuidos por el área de actuación de los polígonos Casa Pau, L'Alfàs I y L'Alfàs II.

Las afecciones previstas implicarán:


Para vehículos se procederá a la ocupación parcial y estrechamiento de carril de circulación en el tramo de la vía que coincida con los pasos proyectados, así como la limitación de la velocidad de circulación en dichos puntos, motivada por la precaución ante riesgos imprevistos por la ejecución de las obras. No se prevé la necesidad de cortar completamente la circulación en ninguna calle para la realización de estos trabajos.

En todo caso, las aceras y/o estacionamientos de su perímetro deben quedar libres de vehículos estacionados para la correcta ejecución de las obras.

Para peatones, siempre que el ancho de las aceras lo permita, se podrá mantener la habitual circulación. En todo caso, se procederá al vallado de las superficies afectadas por las obras, hasta su finalización.

Los puntos de actuación de la unidad que quedan reflejados en la siguiente imagen, afectaran puntualmente a las calles siguientes:

- Avenida del Juguete (cruce con la Calle Granada).
- Calle Granada.
- Calle Córdoba.
- Carrer Pinosos.
- Calle Cádiz.
- Calle Huelva.
- Calle Sevilla.
- Calle Cuenca.
- Calle Madrid.
- Calle Salamanca.
- Calle Castellón de la Plana.

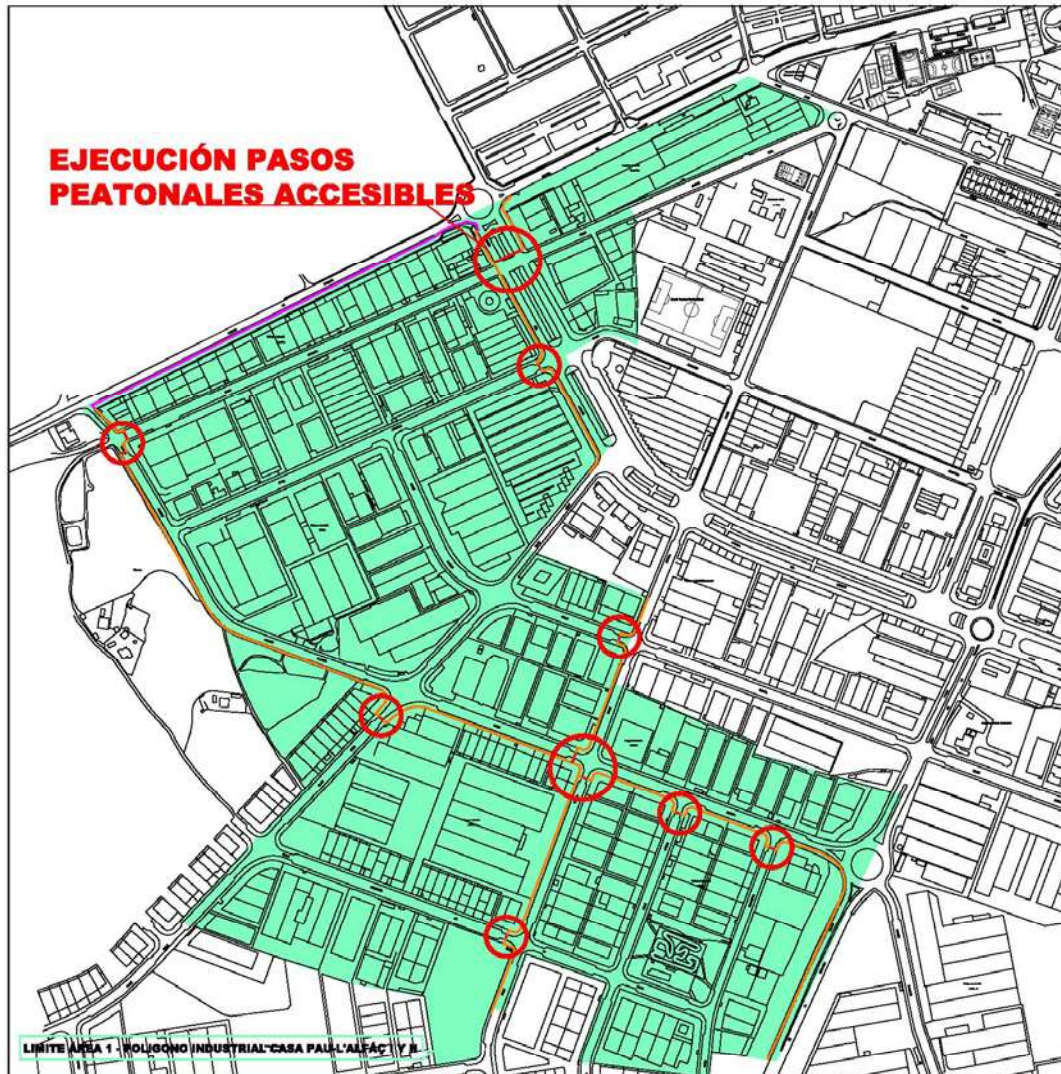

## 2.- UD. MEJORA DE LAS INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS (HIDRANTES AÉREOS A SUSTITUIR).

La unidad consiste en la demolición manual de aceras y soleras, excavación y sustitución de los hidrantes de columna aéreos existentes, por nuevo hidrante soterrado.

Las afecciones previstas implicarán:

Para vehículos se procederá a la ocupación parcial y estrechamiento de carril de circulación en los puntos que coinciden con los hidrantes existentes actualmente. No se prevé la necesidad de cortar completamente la circulación en ninguna calle para la realización de estos trabajos.


En todo caso, las aceras y/o estacionamientos que coincidan en los hidrantes existentes deben quedar libres de vehículos estacionados para la correcta ejecución de las obras.

Para peatones, siempre que el ancho de las aceras lo permita, se podrá mantener la habitual circulación. En todo caso, se procederá al vallado de las superficies afectadas por las obras, hasta su finalización.



Los puntos de actuación de la unidad que quedan reflejados en la siguiente imagen, afectaran puntualmente a los hidrantes en acera de las calles siguientes:

- Avenida del Juguete (cruce con la Calle Granada).
- Calle Córdoba.
- Calle Cádiz.
- Calle Huelva.
- Calle Sevilla.
- Calle Cuenca.
- Calle Madrid.
- Calle Salamanca.
- Calle Castellón de la Plana.

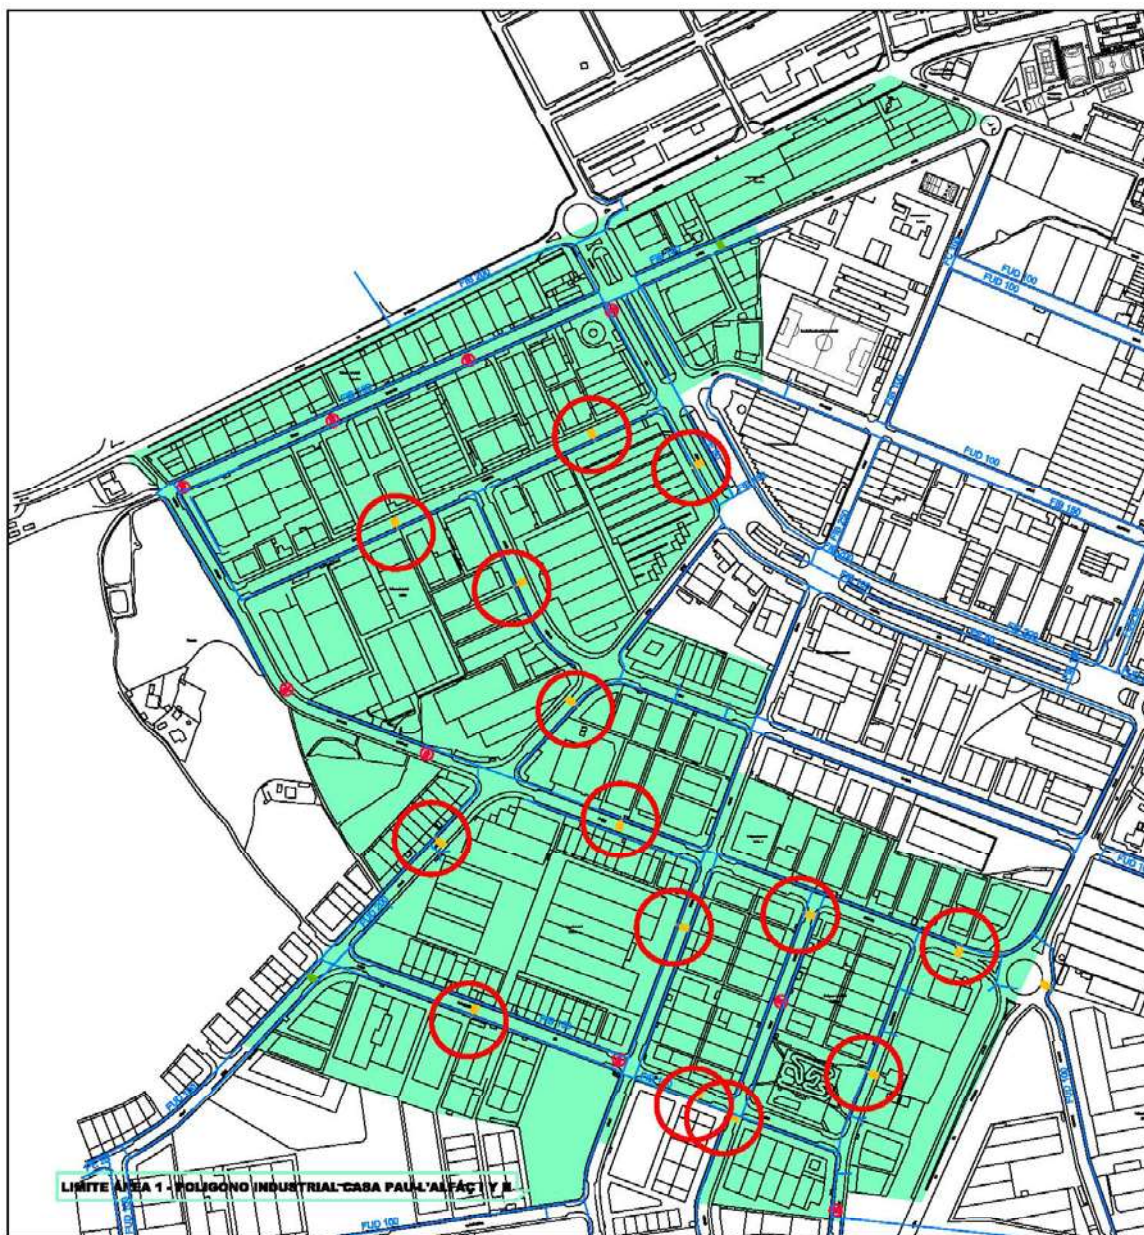

Lo que se comunica a los efectos oportunos, en Ibi, a 5 de octubre de 2017.

**CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L.**
